



کد گزارش: PSGR8907		گزارش کلی ماهیانه وضعیت پروژه ها	 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
صفحه: 1 از 5	تاریخ: 89/07/30		
واحد کنترل پروژه و برنامه ریزی		35 متری باغ گیاه شناسی	

پروژه 35 متری باغ گیاه شناسی




مشاور : مهندسین مشاور رهاب
پیمانکار : قرارگاه سازندگی قائم (عج)

کد گزارش: PSGR8907		گزارش کلی ماهیانه وضعیت پروژه ها	
صفحه: 2 از 5	تاریخ: 89/07/30		
واحد کنترل پروژه و برنامه ریزی		35 متری باغ گیاه شناسی	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

1- مشخصات کلی و شناسنامه پروژه :


عنوان پروژه احداث 35 متری باغ گیاه شناسی	
کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران	
مجری: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	
مشاور: مهندسین مشاور رهاب	پیمانکار: قرارگاه سازندگی قائم(عج)
مدیر پروژه (از طرف کارفرما): مهندس موسوی	سرپرست کارگاه: کیانی فر
تاریخ تحویل زمین: 88/6/28	تاریخ شروع: 88/6/28
منطقه شهرداری: 22	تاریخ اتمام پیش بینی شده: 89

پلان هندسی پروژه:

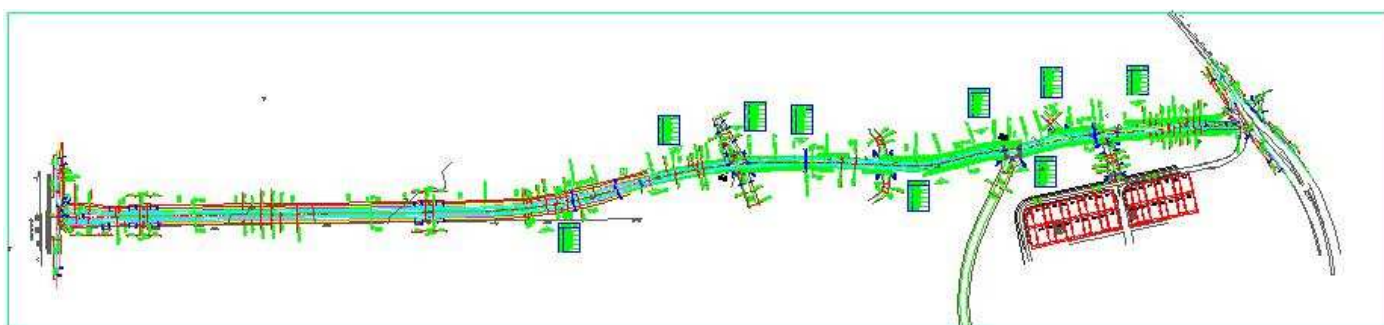

شرح کلی و پروژه :

اجرای عملیات احداث 35 متری چیتگر حد فاصل بلوار پژوهش تا بلوار ایران خودرو به منظور دسترسی و ارتباط مابین فاصل بلوار پژوهش تا بلوار ایران خودرو میباشد.

کد گزارش: PSGR8907		گزارش کلی ماهیانه وضعیت پروژه ها	
صفحه: 3 از 5	تاریخ: 89/07/30		
واحد کنترل پروژه و برنامه ریزی		35 متری باغ گیاه شناسی	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

بخشهای مختلف پروژه:

- 1- کیلومتر از 0.000 تا 1000.00 هر باند شامل 3 خط عبوری با رفوژ 2 متری و در باند شمالی شامل مسیر دوچرخه و عابر.
- 2- کیلومتر از 1000 تا 2092 هر باند شامل 2 خط عبوری با رفوژ 1 متری و در باند شمالی شامل مسیر دوچرخه و عابر.
- 3- از کیلومتر از 1200 تا 2092 مسیر دوچرخه و عابر در باند شمالی از داخل جنگل چیتگر عبور مینماید.

مشخصات فنی پروژه:


مسیر پروژه بطول 2092 متر و به عرض متوسط 30 متر و با شیب طولی متوسط 5٪ و 15 سانتیمتر و 15 سانتیمتر زیر اساس 15 سانتیمتر اساس، 11 سانتیمتر آسفالت بیندر و 4 سانتیمتر آسفالت توپگا.

شرح فعالیت های اجرایی به صورت تجمعی:

- 1) خاکبرداری و خاکریزی
- 2) تکمیل لایه سابگرید
- 3) جدول کاری
- 4) اجرای لایه اساس وزیر اساس
- 5) اجرای آسفالت

نکات قابل توجه و مشکلات پروژه:

خطوط انتقال نیرو

کد گزارش: PSGR8907		گزارش کلی ماهیانه وضعیت پروژه ها	 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
صفحه: 4 از 5	تاریخ: 89/07/30		
واحد کنترل پروژه و برنامه ریزی		35 متری باغ گیاه شناسی	



اجرای لایه ساب بیس



اجرای لایه ساب بیس
